

# 독봉산 웰빙공원 조성

## □ 목 적

- 휴식공간을 필요로 하는 시민의 요구와 기대에 부응
- 쾌적한 도시환경 조성과 시민휴식 및 정서함양에 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 상동동 369번지 일원
- 사업기간 : 2008. 04 ~ 2011. 07
- 사업량 : 공원 조성(42,100m<sup>2</sup>)
- 공정율 : 100%(‘11. 7월말 기준)

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2010년	2011년		2012년이후
				기집행	미집행	
계	70	66	2	2	-	-
도 비	20	20	-	-	-	-
시 비	50	46	2	2	-	-

※ 투자계획은 2011년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


## □ 추진상황 및 향후계획

- 2004 ~ 2008 : 실시설계 및 도시계획 결정
- 2008. 04. : 공원조성 공사 착공
- 2010. 04. 20 : 공원 명칭(독봉산웰빙공원) 결정
- 2010. 08. 31 : 공원 조성공사 준공
- 2011. 07. 12 : 독봉산웰빙공원 조경공사 준공

## □ 사업 효과

- 시민의 휴식을 위한 쾌적한 공원시설 확충
- 휴식과 운동, 취미활동 장소로 활용되어 시민복지 증대에 기여

## □ 위치도

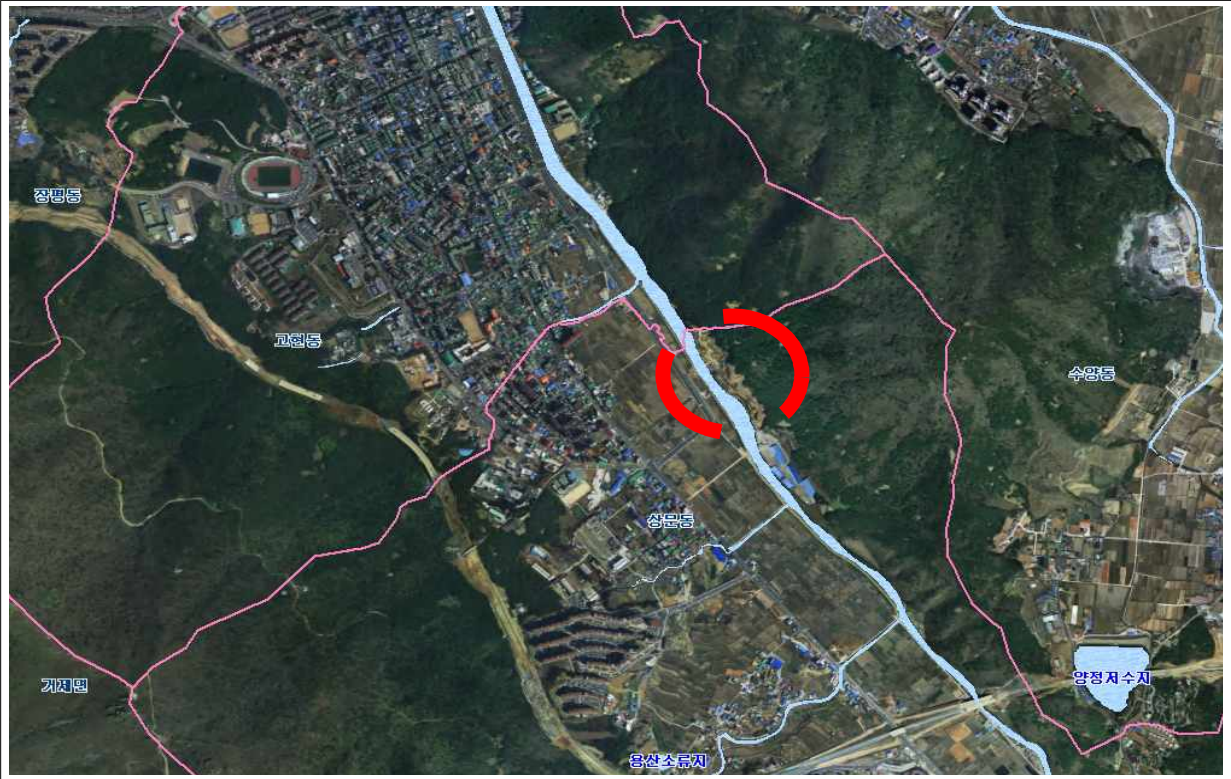

## □ 현장사진

