

# 옥포~덕포간 도로(대로3-1호선) 확포장

## □ 목 적

- 국가기간사업지원 및 거가대교 접속도로의 원활한 추진도모
- 도시기반시설 확충으로 주민생활 및 외래 관광객 교통불편 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 옥포동(옥포기념공원 ~ 국지58호선 덕포IC)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2012년
- 사업량 : L=1,760m, B=25m
- 공 정 율 : 85%(‘11. 7월말 기준)

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2010년	2011년		2012년 이후
				기집행	미집행	
계	125	94	21	5	5	-
국 비	10	10	-	-	-	-
도 비	8	8	-	-	-	-
시 비	107	76	21	5	5	-

※ 투자계획은 2011년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


## □ 추진상황 및 향후계획

- 2009.06. : 전체분 및 1차분 계약체결 및 착공
- 2010.02. : 2차분(잔여분) 계약체결 및 착공
- 2010.09. : 1차분 준공
- 2011.12. : 전체분 (조기)준공 예정

## □ 사업 효과

- 거가대로와 연계 도로망 정비에 따른 물류 수송비 절감
- 이용주민, 관광객 교통불편 해소 및 관광객 증가에 따른 지역경제 활성화

## □ 위치도

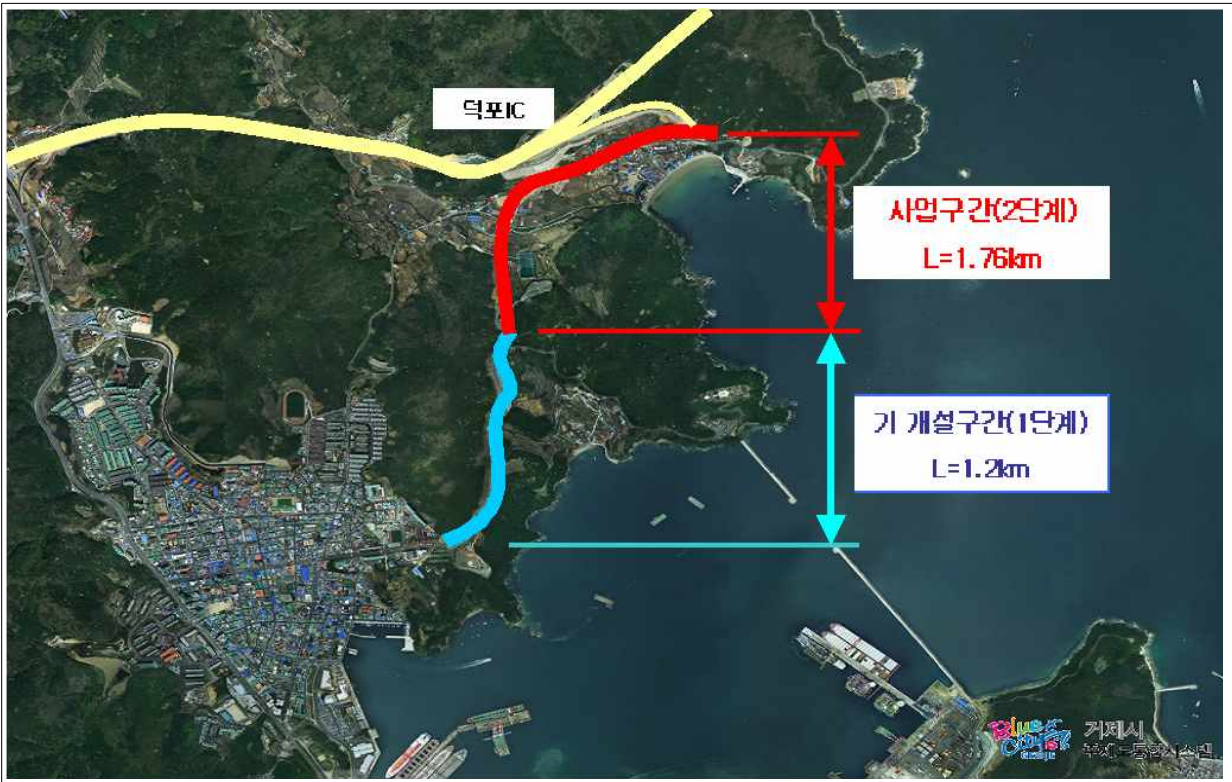

## □ 현장사진

