

신오교 접속도로 확·포장

□ 목 적

- 한내공단 및 지방산업단지 조선기자재의 원활한 물류수송 도모
- 상습정체지역인 중곡일대 교통량 분산을 위해 도로 확·포장 시급

□ 사업개요

- 위 치 : 고현동 일원
- 사업기간 : 2008. 9. 16. ~ 2011. 6. 30.
- 사업량 : 도로 확·포장 L=700m, B=20m
- 공 정 율 : 100%(‘11. 7월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2010년	2011년		2012년 이후
				기집행	미집행	
계	103	81	14	8	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	5	-	-	5	-	-
시 비	98	81	14	3	-	-

※ 투자계획은 2011년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


□ 추진상황 및 향후계획

- ‘08. 09. : 공사착공(총괄분 및 1차분)
- ‘09. 01. ~ 09. : 2, 3차분 착공
- ‘10. 10. : 1, 2차분 준공
- ‘10. 12. : 부분개통(거가대교 개통일 : 2010.12.14)
- ‘11. 06. : 전체 준공

□ 사업 효과

- 시가지 내부 교통량 분산으로 상습정체 지역인 중곡일대 교통난 해소
- 한내공단 일대 조선기자재 원활한 물류수송 및 안전사고 예방

□ 위치도

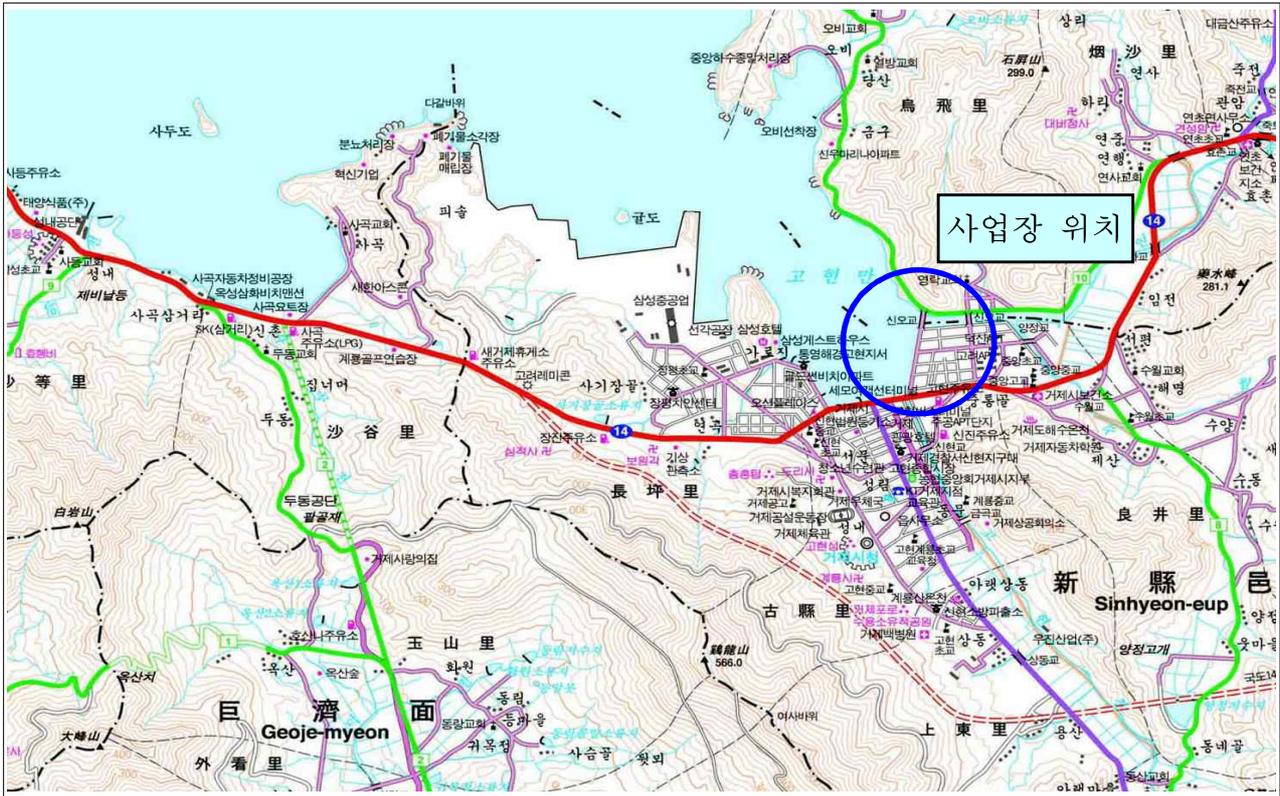

□ 현장사진

